



**OPIS Z FOTOGRAFIAMI WYBRANYCH ZADAŃ WYKONANYCH
W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH W SYSTEMIE ZLECONYM
W 2011 ROKU**

Listopad 2011 r.

Remont drogi powiatowej nr 1346N Pieniężno – Babiak - Etap II



NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

- profilowanie podbudowy- istniejącej naw betonem asfaltowym AC 16W, w miejscach największych nierówności i na zjazdach utwardzonych w ilości 1794 t
- wyrównanie podbudowy- istniejącej naw betonem asfaltowym AC 16W, średniej gr. 4 cm (min 3 cm), w ilości 80437,0 m²
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm, w ilości 80 122,0 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm, w ilości 79 491,0 m²
- ułożenie siatki zbrojeniowej, szklano - węglowej, przesączonej asfaltem, wg rysunków i SST, w ilości 80437,0 m²
- wykonanie remontu chodnika w m. Lechowo, w ilości 367,0 m / 521,0 m²
- wykonanie azyli dla pieszych, w obrębie przystanków autobusowych na trasie DP 1346N, w ilości 71 m / 172 m²
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym tablic prowadzących na łukach w ilości 81 szt., montaż barier stalowych ochronnych w ilości 784,0 m,
- wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych,
- ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z ułożeniem naw kruszywa 0/31, gr. 15 cm, w ilości 30 337,0 m²
- oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie rowów, w ilości 24,997 km.

Łączna długość – 15 798 mb

Wartość robót – 8 794 803,77 zł. brutto



Remont drogi powiatowej nr 1346N Pieniężno – Babiak - Etap II

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011

Przed remontem



Po remoncie



Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork – Bogdany - Kanał Kopernika

Rezerwa subwencji ogólnej

- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej (poszerzenie ist. nawierzchni)
- wykonanie przejść dla pieszych
- ścinanie i uzupełnienie poboczy
- Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem Ø500mm oraz kratką ściekową tuż za płytą przejściową na dojeździe od strony m. Bogdany
- Zamontowanie na obiekcie stalowej bariery mostowej po obu stronach pomostu,
- Zamontowanie na obiekcie stalowej balustrady ozdobnej
- Na dojazdach wbicie stalowych barier drogowych
- Umocnienie przestrzeni podmostowej oraz koryta rzeki na długości ok.15,40m materacami gabionowymi gr. 30cm na warstwie geowłókniny separacyjnej
- Wykonanie poszerzenia skarp drogowych na dojazdach do mostu

Wartość robót – 1 299 490,92 zł.



Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork – Bogdany - Kanał Kopernika

Przed remontem



Po remoncie



Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno – Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie



**Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013**

- wzmocnienie nawierzchni, ułożenie warstwy profilowej wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- Ułożenie nawierzchni chodników z nowych elementów
- ustawienie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
- budowa mini ronda przy sądzie rejonowym
- Ustawienie barier ochronnych jednostronnych

Łączna długość – 990 mb

Roboty jeszcze w trakcie realizacji

Wartość robót – 2 316 000,00 zł. brutto (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej)




Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno – Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377N ulice: Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie



Przed remontem



Po remoncie

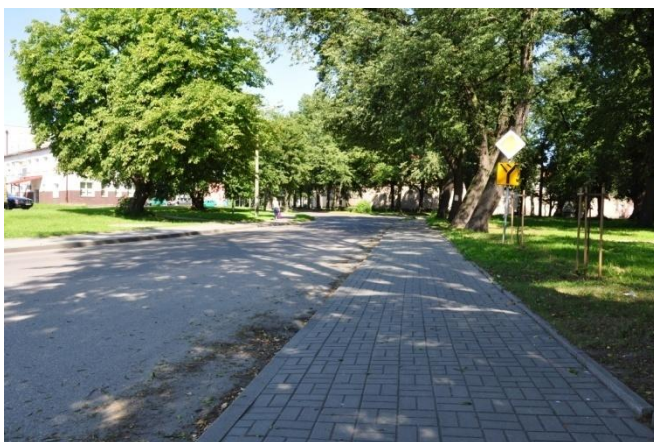



Naprawa kolein i ubytków w podbudowie drogi powiatowej Nr 1393N odc. Omaza - Żelazna Góra

Zakres robót:

- oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją w ilości 1806m²
- uzupełnienie kolein i ubytków podbudowy betonem asfaltowym (AC 16 W) w ilości 32t.
- wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym (AC 16 W) 21 t.

Powierzchnia – 1806 m²

Łączna długość – 480 mb

Wartość robót – 13 777,00 zł. brutto



Naprawa kolein i ubytków w podbudowie drogi powiatowej Nr 1393N odc. Omaza - Żelazna Góra

Przed remontem



Po remoncie



Remont dróg powiatowych polegający na wykonaniu zadań:

Zadanie 1: Modernizacja drogi nr 1330N na odcinku Pierzchały – Dąbrowa

Zadanie 2: Modernizacja drogi nr 1377N na odcinku Ułowo – Braniewo

Zadanie 3: Modernizacja drogi nr 2324N na odcinku Braniewo - Rudłowo

Zadanie 4: Modernizacja drogi nr 1320N na odcinku Krzekoty - Lelkowo

Zadanie 5: Modernizacja drogi nr 1342N na odcinku Bardyny - Łozy

Zadanie 6: Modernizacja drogi nr 1385N na odcinku Szalmia – Bemowizna



- Zadanie Nr 1: Modernizacja drogi powiatowej nr 1330N odc. Pierzchały – Dąbrowa, dł. 400,0 mb; szer. 5,20 mb; pow. 2 080,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej;
- Zadanie Nr 2: Modernizacja drogi powiatowej nr 1377N odc. Ułowo – Braniewo, dł. 500,0 mb; szer. 5,5 mb; pow. 2 750,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej;
- Zadanie Nr 3: Modernizacja drogi powiatowej nr 2324N odc. Braniewo – Rudłowo, dł. 200,0 mb; szer. 3,0 mb; pow. 600,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowych warstw: 600,0 m² wiążącej i 600,0 m² ścieralnej;
- Zadanie Nr 4: Modernizacja drogi powiatowej nr 1320N odc. Krzekoty – Lelkowo, dł. 600,0 mb; szer. 5,0 mb; pow. 3 000,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej;
- Zadanie Nr 5: Modernizacja drogi powiatowej nr 1342N odc. Bardyny – Łozy, dł. 415,0 mb; szer. 5,0 mb; pow. 2 075,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowych warstw: 2 075,0 m² wiążącej i 2 075,0 m² ścieralnej;
- Zadanie Nr 6: Modernizacja drogi powiatowej nr 1385N odc. Szalmia – Bemowizna, dł. 750,0 mb; szer. 6,1 mb; pow. 4 575,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej;
- Zadanie Nr 7: Modernizacja drogi powiatowej nr 1389N odc. Dębiny – Wilczęta, dł. 470,0 mb; szer. 5,5 mb; pow. 2 585,0 m² – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej.

Powierzchnia – 17 665,00 m²

Łączna długość – 3,335 mb

Wartość robót – 518 801,70 zł. brutto





Remont dróg powiatowych polegający na wykonaniu zadań:
Zadanie 1: Modernizacja drogi nr 1330N na odcinku Pierzchały – Dąbrowa
Zadanie 2: Modernizacja drogi nr 1377N na odcinku Ułowo – Braniewo
Zadanie 3: Modernizacja drogi nr 2324N na odcinku Braniewo - Rudłowo
Zadanie 4: Modernizacja drogi nr 1320N na odcinku Krzekoty - Lelkowo
Zadanie 5: Modernizacja drogi nr 1342N na odcinku Bardyny - Łozy
Zadanie 6: Modernizacja drogi nr 1385N na odcinku Szalmia – Bemowizna

Przed remontem



Po remoncie





Naprawa nawierzchni dróg powiatowych

Droga powiatowa nr 1165N odc. Frombork (Kanał Kopernika) – Biedkowo Osada

- długość 800 mb
- pow. 3680,0 m²
- w-wa wyrównawcza 150 t z betonu asfaltowego AC 16W
- w-wa MNU (mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu nieciągłym) 3680 m²

Droga powiatowa nr 1381N odc. Braniewo – Zawierz

- długość 378 mb
- pow. 2268 m²
- w-wa wyrównawcza 170 t z betonu asfaltowego AC 16W
- w-wa MNU (mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu nieciągłym) 2268 m²

Powierzchnia – 5948 m²

Łączna długość – 1178 mb

Wartość robót – 198 086,92 zł. brutto



Naprawa nawierzchni dróg powiatowych

Przed remontem



Po remoncie





Remont przepustu w miejscowości Tatarki ciągu drogi powiatowej nr 1348N na odc. Gładysze - Osiek

- rozebranie ścian betonowych 4,80 m³
- Rozebranie ścian żelbetowych 3,00 m³
- Ułożenie rury z blachy karbowanej 12,00 mb
- Betonowanie 21,30 m³
- Wykonanie ścian oporowych z kamienia 9,00 m³
- Brukowanie skarp 21,00 m²
- Oczyszczenie rowów 10,00 mb

Wartość robót – 54 112,30 zł. brutto



Remont przepustu w miejscowości Tatarki ciągu drogi powiatowej nr 1348N na odc. Gładysze - Osiek

Przed remontem



Po remoncie





Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2338N ul. Różana, nr 2344N ul. Traugutta w Braniewie

Ul. Traugutta

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami
- Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm
- Ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm
- Ustawienie obrzeży i krawężników

Łączna długość – 218,00 mb

Powierzchnia – 345,00 m²

Wartość robót – 46 121,33 zł. brutto



Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2338N ul. Różana, nr 2344N ul. Traugutta w Braniewie

Przed remontem



Po remoncie





Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1308N w miejscowości Wielkie Wierzno

Wykonanie chodnika:

- z kostki betonowej gr. 6 cm – 142 m²
- z kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach 34 m²

Długość chodnika – 111 mb

Wartość robót – 25 752,75 zł. brutto



Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery ochronne

Zakres robót:

- Ustawienie barier stalowych ochronnych w ilości 492 mb
- Ustawienie barieroporęczy w ilości 24 mb

Wartość robót – 80 161,56 zł. brutto

